





### ①平成22年冬頃

杭工事は約4ヶ月で完了します。また、杭工事が完了したエリアから基礎版工事を開始していきます。冬季もシート、テント等で養生を行い、工事を進めていきます。

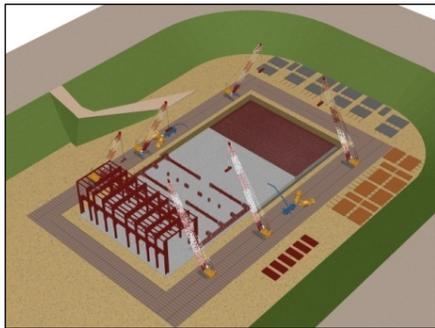


### ②平成24年春頃

基礎版工事は約6ヶ月で完了します。また、基礎版工事が完了した一部のエリアで、鉄骨柱・梁の組み立てを行い、上屋工事が本格化します。

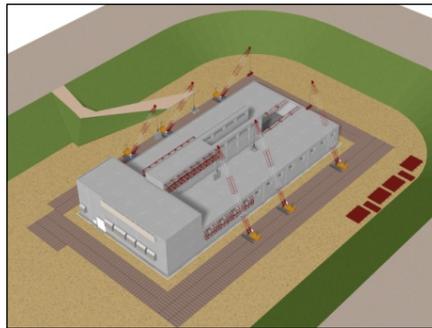

### ③平成24年冬頃

上屋工事も中盤に入り、貯蔵建屋の外形が出来上がっていきます。外壁には、仕上げとして塗装を行っていきます。

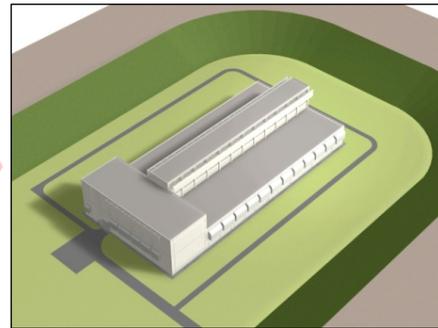

### ④完成予想図

上屋工事は約17ヶ月で完了します。最終的に国の検査に合格した後、事業を開始します。

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
主要工程	① ▼8月着工	(休止)	②	③
杭工事	約4ヶ月			
基礎版工事	約4ヶ月		約2ヶ月	
上屋工事			約17ヶ月	
				④ ▼10月 事業開始
